TN223 Afløb og faldstammer

Tilsynsnotat

Projekt		Arbejdspakke	Pihl TE byggeledelse
Sagsnr.	2018_005	Workflow	Tilsyn - Teknik
Tilsynsplan	Pihl - 5810 Tilsynsplan VVS	Oprettelsesdato	15. jun 2020, 13:27
Kontrolpunkt	Afløbssystem inkl. faldstammer og afløb fra badekabine	Deadline	-
Bygning	BF13	Oprettet af	
Etage	(04) 1 Sal	Ansvarlig	(Godkendt, lukket)
Tegning	FB2_I13_K01_H1-1_E01_N01 (Version 4)		

Byggefelt	BF 13

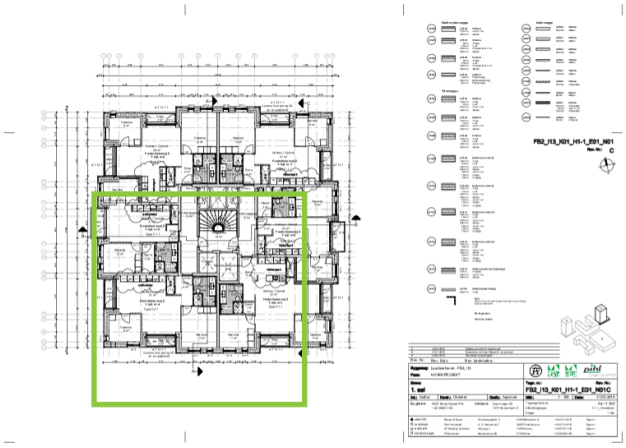

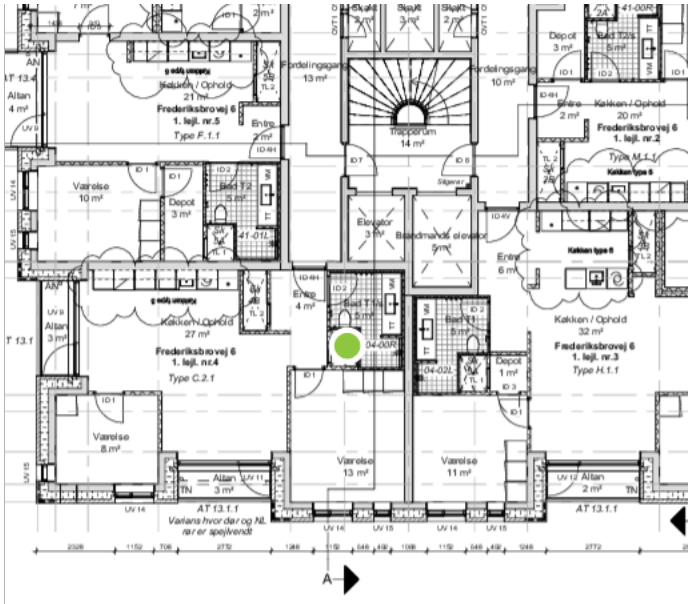

15. jun 2020, 13:27
Tildelt til

Oprettet af:	Pihl & Søn A/S
Tildelt:	
Emne:	Afløb og faldstammer
Beskrivelse:	faldstamme ikke monteret iht. afløbsdiagram. faldstamme på afgrening i stedet for afløb cisterne på BK. burde denne ikke være omvendt? TE - Afklaring følger.

1.1, 2020-06-15, 13.24

1.2, 2020-06-15, 13.24

1.3, 2020-06-15, 13.24

18. jun 2020, 07:05
Klarmeldt af

Opdateret af:	
Ny ansvarlig:	Pihl & Søn A/S
Beskrivelse:	Denne løsning er OK

1. jul 2020, 15:04
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af:	Jacob Clemmen& Søn A/S
Stedfortræder for:	Pihl & Søn A/S
Beskrivelse:	Noteret

TN224 Gennemføringer lodret

Tilsynsnotat

Projekt		Arbejdspakke	Pihl TE byggeledelse
Sagsnr.	2018_005	Workflow	Tilsyn - Teknim
Tilsynsplan	Pihl - 5830 Tilsynsplan Ventilation	Oprettelsesdato	15. jun 2020, 13:39
Kontrolpunkt	Brandfuger og lodrette gennemføringer	Deadline	-
Bygning	BF13	Oprettet af	Pihl & Søn A/S
Etage	(05) 2 Sal	Ansvarlig	(Godkendt, lukket)
Tegning	FB2_I13_K01_H1-1_E02_N01 (Version 4)		
Rum	Værelse 1434		

Byggefelt	BF 13

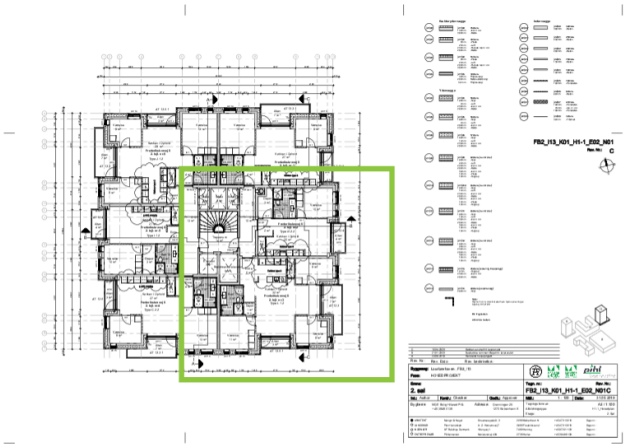

15. jun 2020, 13:39
Tildelt til

Oprettet af:	Pihl & Søn A/S
Tildelt:	
Emne:	Gennemføringer lodret
Beskrivelse:	Udsparringer for Ventilation er placeret skævt over hinanden på tværs af 1, 2, 3 og 4 sal. omfang skal afklares, evt. Boring af huller er sandsynligvis påkrævet, da tolerancen overskrides. TE - afventer afklaring fra UE.

1.1, 2020-06-15, 13.34

1.2, 2020-06-15, 13.34

1.3, 2020-06-15, 13.34

1.4, 2020-06-15, 13.35

1.5, 2020-06-15, 13.35

17. jun 2020, 13:23
Afvist af

Opdateret af:	
Ny ansvarlig:	Pihl & Søn A/S
Beskrivelse:	Der er ventilationsteknisk ingen udfordring (lyd, fordeling mm) i forhold til kanal-føring, som bibeholdes.

1. jul 2020, 15:06
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af:	Pihl & Søn A/S
Stedfortræder for:	Pihl & Søn A/S
Beskrivelse:	Ok, forholdet er kommenteret af Pihl, og lukkes for nu. Genåbnes evt. hvis Bygherre påtaler det.

TN1024 Gulvvarmeføring

Tilsynsnotat

Projekt		Arbejdspakke	Pihl TE byggeledelse
Sagsnr.	2018_005	Workflow	Tilsyn - Teknik
Tilsynsplan	Pihl - 5810 Tilsynsplan VVS	Oprettelsesdato	9. okt 2020, 10:10
Kontrolpunkt	Gulvvarme Inkl. Trækrør i undergulv.	Deadline	-
Bygning	BF13	Oprettet af	Pihl & Søn A/S
Etage	(10) 7 Sal	Stedfortræder for	Pihl & Søn A/S
Tegning	FB2_I13_K01_H1-1_E07_N01 (Version 4)	Ansvarlig	(Godkendt, lukket)
Placering	BF13, 7. Sal, lejlighed 1		

Byggefelt	BF 13

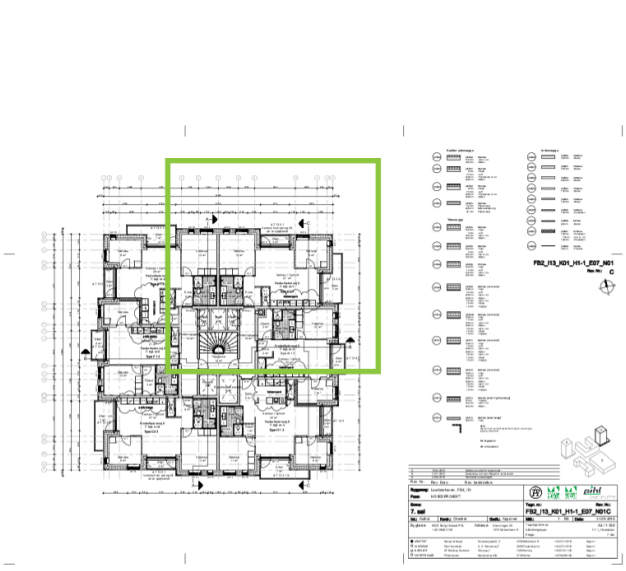

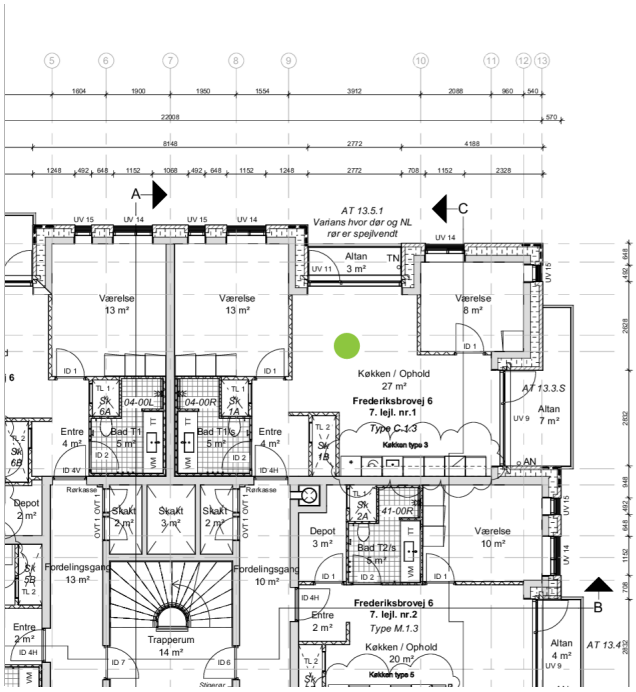

9. okt 2020, 10:10
Tildelt til

Oprettet af:	Pihl & Søn A/S
Stedfortræder for:	Pihl & Søn A/S
Tildelt:	Poul Erik Frederiksen, Halsnæs Smeden
Emne:	Gulvvarmeføring
Beskrivelse:	Tjek af gulvvarmeføring i undergulv. Godkendt.

1.1, 2020-10-09, 10.08

1.2, 2020-10-09, 10.08

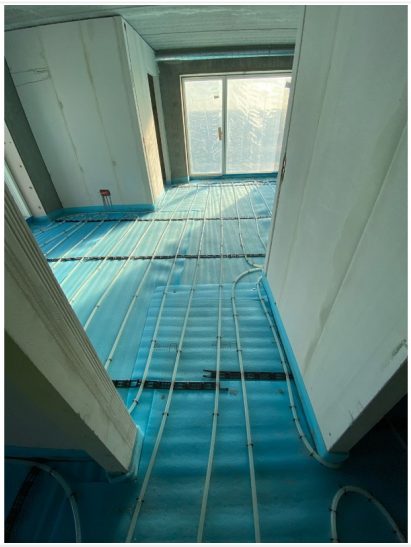

1.3, 2020-10-09, 10.08

1.4, 2020-10-09, 10.08

1.5, 2020-10-09, 10.08

1.6, 2020-10-09, 10.08

1.7, 2020-10-09, 10.08

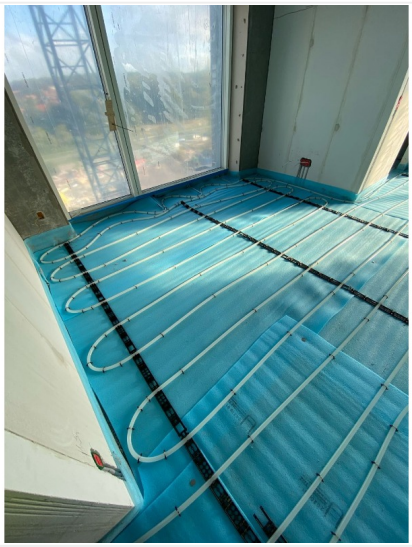

1.8, 2020-10-09, 10.08

9. okt 2020, 10:10
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af:	Rihl & Søn A/S
Stedfortræder for:	Pihl & Søn A/S
