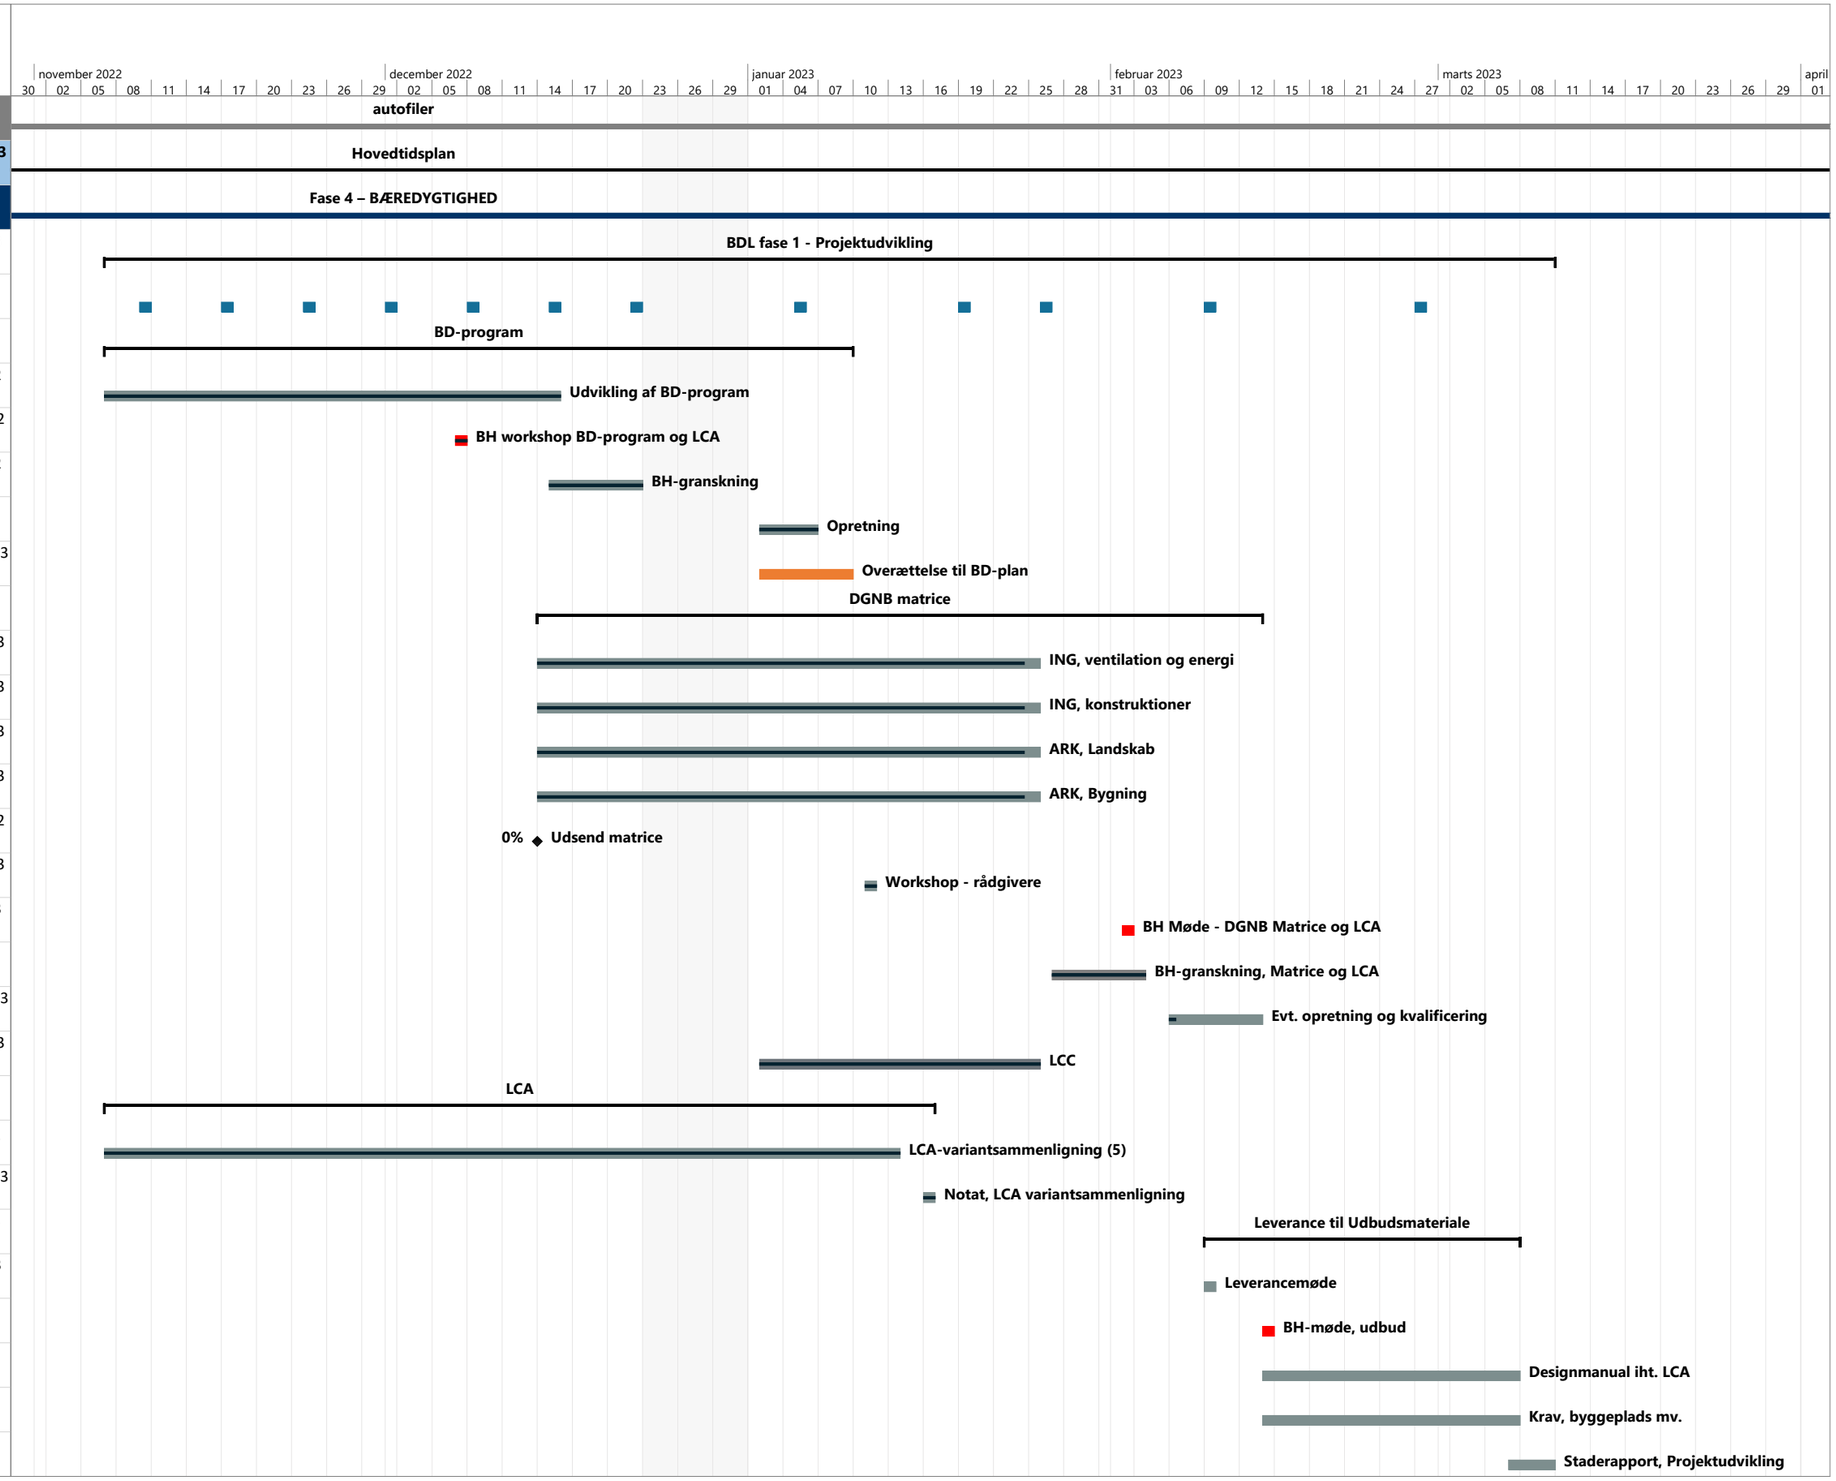Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
0	autofiler	860 dage?	m a 01/08/22	m a 12/01/26
1	**Hovedtidsplan**	**275 dage**	**ma 01/08/22**	**on 06/09/23**
20	Fase 4 – BÆREDYGTIGHED	860 dage?	m a 01/08/22	m a 12/01/26
21	**BDL fase 1 - Projektudvikling**	**84 dage?**	**ma 07/11/22**	**fr 10/03/23**
22	**BD møder**	**72 dage?**	**to 10/11/22**	**ma 27/02/23**
35	**BD-program**	**40 dage?**	**ma 07/11/22**	**ma 09/01/23**
36	Udvikling af BD-program	29 dage	ma 07/11/22	to 15/12/22
37	BH workshop BD-program og LCA	1 dag?	on 07/12/22	on 07/12/22
38	BH-granskning	6 dage?	to 15/12/22	to 22/12/22
39	Opretning	5 dage?	ma 02/01/23	fr 06/01/23
40	Overættelse til BD-plan	6 dage?	ma 02/01/23	ma 09/01/23
41	**DGNB matrice**	**38 dage?**	**on 14/12/22**	**ma 13/02/23**
42	ING, ventilation og energi	25 dage?	on 14/12/22	on 25/01/23
43	ING, konstruktioner	25 dage?	on 14/12/22	on 25/01/23
44	ARK, Landskab	25 dage?	on 14/12/22	on 25/01/23
45	ARK, Bygning	25 dage?	on 14/12/22	on 25/01/23
46	Udsend matrice	0 dage	on 14/12/22	on 14/12/22
47	Workshop - rådgivere	1 dag	on 11/01/23	on 11/01/23
48	BH Møde - DGNB Matrice og LCA	1 dag?	to 02/02/23	to 02/02/23
49	BH-granskning, Matrice og LCA	6 dage	fr 27/01/23	fr 03/02/23
50	Evt. opretning og kvalificering	6 dage?	ma 06/02/23	ma 13/02/23
51	**LCC**	18 dage	ma 02/01/23	on 25/01/23
52	**LCA**	**45 dage?**	**ma 07/11/22**	**ma 16/01/23**
53	LCA-variantsammenligning (5)	44 dage?	ma 07/11/22	fr 13/01/23
54	Notat, LCA variantsammenligning	1 dag	ma 16/01/23	ma 16/01/23
55	**Leverance til Udbudsmateriale**	**19 dage?**	**to 09/02/23**	**ti 07/03/23**
56	Leverancemøde	1 dag?	to 09/02/23	to 09/02/23
57	BH-møde, udbud	1 dag?	ti 14/02/23	ti 14/02/23
58	Designmanual iht. LCA	16 dage?	ti 14/02/23	ti 07/03/23
59	Krav, byggeplads mv.	16 dage?	ti 14/02/23	ti 07/03/23
60	Staderapport, Projektudvikling	4 dage?	ti 07/03/23	fr 10/03/23
