

EKSEMPEL 2

SNITFLADER VED PROJEKTERING OG MONTAGE AF BETONELEMENTER

bips publikation A113 »Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton« giver forskellige modeller for samarbejdet mellem rådgiver og leverandør. Nedenfor ses et paradigme for et ydelsesfordelingskema.

Bygherre	Byggesag
Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton Ydelsesfordeling Bygningsafsnit/elementer:	Udarb.: Dato : Rev. :

Ydelsesfordeling – model 7


	Rådgiveren	Leverandøren	Montage-entreprenøren
1. Projektgrundlag-bygværk			
2. Projektgrundlag-elementer			
3. Bygværksprojektering (inkl. statiske beregninger-bygværk)			
4. Elementprojektering (inkl. statiske beregninger-elementer)			
5. Oversigtstegninger-arkitekt			
6. Oversigtstegninger-konstruktion			
7. Oversigtstegninger-el			
8. Hulplaner			
9. Fugearmeringsplaner			
10. Krav til samlingsdetaljer			
11. Samlingsdetaljer			
12. Arbejdsbeskrivelse-leverance, inkl. bygningsdelsbeskrivelser			
13. Arbejdsbeskrivelse-montage, inkl. bygningsdelsbeskrivelser			
14. Bygningsdelspecificationer			
15. Bygningsdelstegninger			
16. Krav til bygningsdelsdetaljer			
17. Bygningsdelsdetaljer			
18. Elementinddeling			
19. Arbejdstegninger			
20. Nummerplaner			
21. Elementlister			
22. Risikospecifikation-montage			
23. Risikospecifikation-elementer			
24. Leverandørbrugsanvisning			
25. Montageplanlægning (inkl. montageplan)			
26. Montageforholds indflydelse på projektering			
27. Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning			
28. Planlægning og projektering af afstivninger og understøtninger			
29. Planlægning og projektering af fastgørelser			

EKSEMPEL PÅ LEVERANDØRPROJEKTERING – MODEL »3L«

Publikationen foreslår en række standardmodeller, hvoraf model 3L er vist nedenfor som eksempel. Illustrationen tydeliggør fordelingen af ydelserne mellem aktørerne i en byggesag. »L« i modelbetegnelsen indikerer, at leverandøren forestår elementprojekteringen.

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Del A

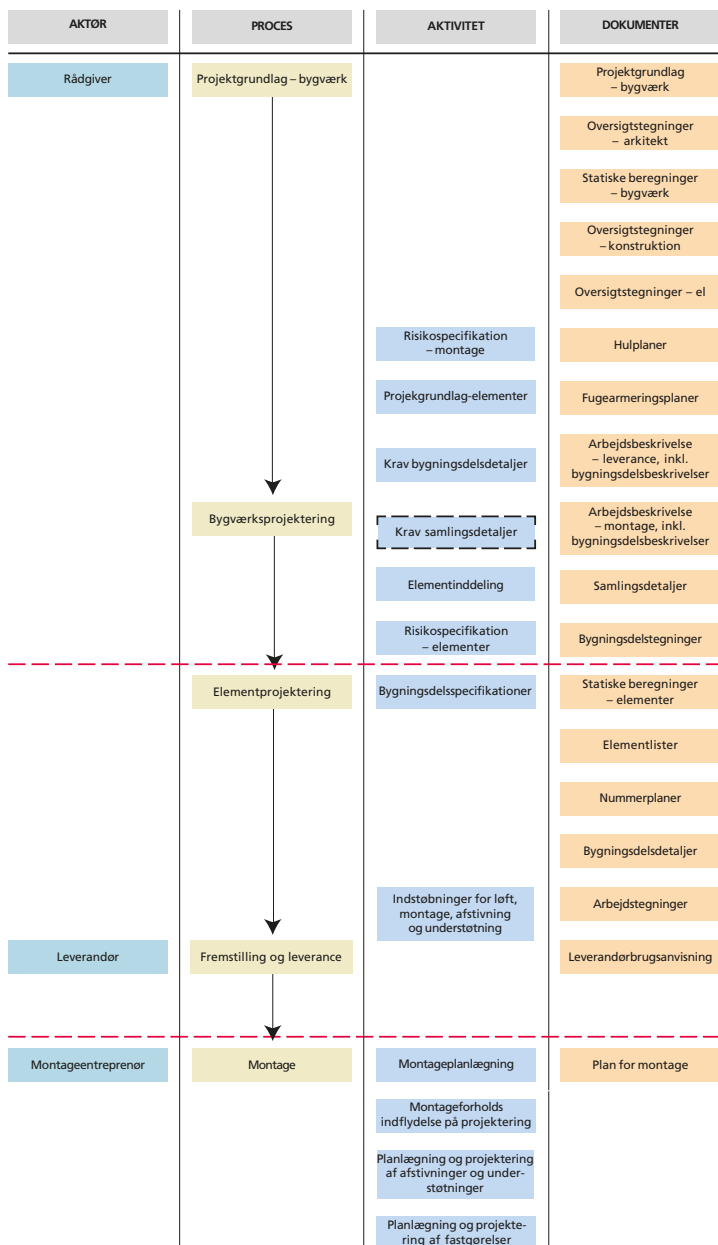


Model 3L

EKSEMPEL PÅ SAMPROJEKTERING – MODEL »3R«

Model »R« der fordeler projekteringsydelse og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

Del A

Fordeling af projekteringsydelse og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

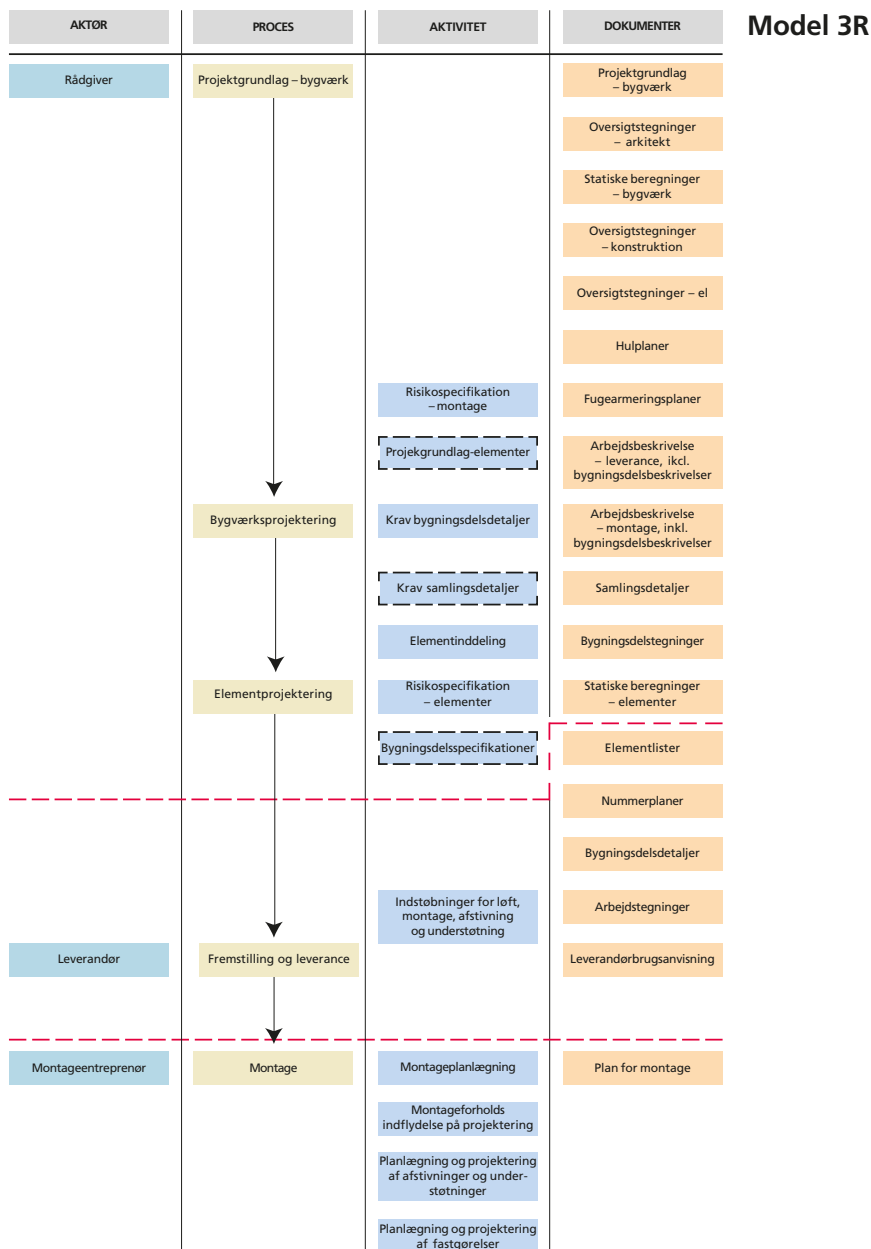

Model 3R
